GESTÃO DE PROJETOS DE TI

NOSSA HISTÓRIA

A nossa história inicia-se com a ideia visionária e da realização do sonho de um grupo de empresários na busca de atender à crescente demanda de cursos de Graduação e Pós-Graduação. E assim foi criado o Instituto, como uma entidade capaz de oferecer serviços educacionais em nível superior.

O Instituto tem como objetivo formar cidadão nas diferentes áreas de conhecimento, aptos para a inserção em diversos setores profissionais e para a participação no desenvolvimento da sociedade brasileira, e assim, colaborar na sua formação continuada. Também promover a divulgação de conhecimentos científicos, técnicos e culturais, que constituem patrimônio da humanidade, transmitindo e propagando os saberes através do ensino, utilizando-se de publicações e/ou outras normas de comunicação.

Tem como missão oferecer qualidade de ensino, conhecimento e cultura, de forma confiável e eficiente, para que o aluno tenha oportunidade de construir uma base profissional e ética, primando sempre pela inovação tecnológica, excelência no atendimento e valor do serviço oferecido. E dessa forma, conquistar o espaço de uma das instituições modelo no país na oferta de cursos de qualidade.

Sumário

NOSSA HISTÓRIA 2

1. INTRODUÇÃO 4

2. PROJETO 5

2.2 Como funciona a gestão de projetos de TI 6

2.2.1 Ciclo de vida do projeto 6

2.2.2 Motivações para projetos 8

3. GERENCIAMENTO DE PROJETOS 9

3.1 Conceito de gerenciamento de projetos 9

3.2 Gerente de projetos 10

3.2.1 Gerenciamento de portfólio e gerenciamento de programas. 11

3.2.2 Gerenciamento ágil de projetos 12

3.2.3 Maturidade na gestão de projetos 13

3.3 Influência organizacional 16

3.3.1 Influência organizacional: stakeholders 16

3.3.2 Influência organizacional: cultura organizacional 17

3.3.3 Influência organizacional: comunicações 18

3.4 Estruturas organizacionais 19

3.4.1 Estrutura organizacional: funcional 19

3.4.2 Estrutura organizacional: projetizada 21

3.4.3 Estrutura organizacional: matricial 22

4. ESCRITÓRIO DE PROJETOS 26

4.1 Implantação de um escritório de projetos 27

5. REFERÊNCIAS: 29

1. INTRODUÇÃO

As organizações imprimem constante atualização e adequação de seus serviços, processos e produtos perante a demanda do mercado global. Muitos fatores, tais como compartilhamento e distribuição de serviços e processos entre parceiros de negócios, requerem atenção especial quanto ao nível de controle, interação e entrega esperado de cada processo e/ou recurso envolvido.

Nesse contexto, modelos de gestão de projetos são fundamentais para as organizações que precisam se adequar rapidamente aos novos cenários. Os projetos bem gerenciados e bem-sucedidos são fatores determinantes para evolução e destaque não só de uma empresa no mercado global, mas também da eficiência no trato de recursos e suas áreas.

A área de tecnologia da informação (TI) é um ponto dinâmico independentemente do segmento, como gerenciamento de projeto, segurança da informação, gerenciamento de serviços, governança de TI, entre tantos outros, visto a crescente demanda de novas tecnologias, softwares e hardwares e a alta possibilidade que tais recursos permitem quanto a criar, gerir, interagir e compartilhar informações por meio de infraestruturas de redes de dados e computadores.

Sob esse viés é possível vislumbrar a importância da gestão de projetos, em especial projetos de TI, alinhados estrategicamente aos negócios da organização agregando valor e ampliando as perspectivas da corporação.

2. PROJETO

Segundo Vargas, 2018, p.8, projeto é um conjunto de ações, executado de maneira coordenada por uma organização transitória, ao qual são alocados os insumos necessários para, em um dado prazo, alcançar o objetivo determinado. O conceito de organização transitória está diretamente relacionado a um esquema organizacional particular e temporário que somente existe para tornar o trabalho com projetos mais eficiente e intuitivo por parte da organização.

A partir da complexidade dos fatores envolvidos, quantidade e heterogeneidade de equipes e suas competências, imediatismo de resultados, distribuição e compartilhamento de recursos, bem como segmentação lógica de serviços e produção, a gestão por projetos é prática fundamental para obter sucesso nos negócios de uma organização. Tal prática independe de regionalidade, cultura, segmento ou demanda, é fator de sobrevivência organizacional perante as adversidades do mercado global.

Segundo Angelo e Lukosevicius (2016), projeto pode ser definido como uma organização temporária criada com o propósito de entregar um ou mais produtos de negócio de acordo com um business case pré-acordado.

Para Vargas (2018), a etimologia da palavra projeto possui dois significados, podendo ser o primeiro relacionado ao esforço imbuído na produção de um serviço, produto ou obtenção de um resultado específico, e o segundo faz tanger o conceito da palavra com assuntos relacionados e/ou intrínsecos a esta, tais como disciplina do conhecimento, programas, portfólios, recursos, entre outros que suportam, derivam e até mesmo são matéria primordial para o próprio projeto.

> Projetos são realizados para cumprir objetivos através da produção de entregas. Um objetivo é definido como um resultado a que o trabalho é orientado, uma posição estratégica a ser alcançada ou um propósito a ser atingido, um produto a ser produzido ou um serviço a ser realizado (PMI, 2017, p. 4).

Nas elucidações de todos os autores apresentados, encontram-se pelo menos três características intrínsecas quanto à definição de projeto, destacadas a seguir:

Temporal: essa característica faz alusão quanto à duração e/ou limitação do tempo de um projeto. Este tem início e fim, dia e hora para iniciar e findar.

Exclusividade: produto do projeto ou entregável do projeto, independentemente. A propriedade a ser destacada é a exclusividade deste em relação a quaisquer outros produtos e/ou serviços obtidos como resultado.

Objetivo: é condição sine qua non para um projeto que tenha uma meta(s) explícita/clara quanto ao fim/resultado esperado.

Como exemplo de projetos, é possível citar a construção de um edifício, a elaboração de um livro, o desenvolvimento de um e-commerce, o projeto de um casamento, o projeto sobre instalações hidráulicas, a migração de processos legados para a Indústria 4.0, o desenvolvimento de um novo software, mudanças de estruturas organizacionais, implementação de um escritório de projetos, conformidade com novas leis e normas, projetos para desenvolvimento pessoal – treinamentos e qualidade de vida, entre tantos outros.

2.2 Como funciona a gestão de projetos de TI

Esse é um processo que utiliza ferramentas e metodologias para garantir o sucesso de um projeto de TI, cumprindo prazos, orçamentos, requisitos do cliente e expectativas das partes interessadas.

Ele envolve a administração dos projetos para assegurar que as demandas e os fluxos de trabalho estejam alinhados com as necessidades e o cronograma de entregas. O objetivo é atender as expectativas, garantindo que o trabalho seja concluído com sucesso e dentro do prazo estabelecido.

2.2.1 Ciclo de vida do projeto

O conjunto de fases em um projeto é chamado ciclo de vida. O ciclo de vida possibilita avaliar uma série de similaridades que podem ser encontradas em todos os projetos, independentemente de seu contexto, aplicabilidade ou área de atuação (VARGAS, 2018, p. 27).

Dinsmore e Barbosa (2009) afirmam que o ciclo de vida do projeto é composto por fases, que são determinadas por características específicas e necessidade de cada projeto.

A quantidade de fases de um projeto está totalmente relacionada com a complexidade e a própria composição e compartilhamento de recursos nele.

O ciclo de vida do projeto é composto pelas fases:

Iniciação

Nessa primeira fase, é importante determinar a necessidade do projeto e criar uma proposta viável. Certifique-se de confirmar que o projeto realmente vale o tempo e os recursos alocados antes de prosseguir.

Planejamento

A fase de planejamento envolve um esforço colaborativo entre o gestor de TI e a equipe. É importante definir orçamentos, identificar riscos e criar objetivos claros. Um modelo de roteiro pode ser uma ferramenta útil para planejar metas que possam ser consultadas durante todo o ciclo de vida do projeto.

Execução

Durante a fase de execução, a equipe define as entregas e o gerente de projeto de TI desempenha um papel crucial ao delegar tarefas para atingir as metas estabelecidas. É importante manter a comunicação aberta entre todos os envolvidos e contar com um software de colaboração, para garantir que todos estejam alinhados.

Monitoramento e controle

Nesse momento, é fundamental utilizar o software de projetos de TI para acompanhar o progresso das etapas em tempo real. Isso envolve gerenciar o tempo, o custo, o escopo, a qualidade e o risco.

Encerramento

Após a conclusão do projeto, inicia-se a fase de encerramento. Nessa etapa, é importante garantir que todo o trabalho tenha sido concluído, aprovado e transferido para a equipe apropriada.

É fundamental reservar um tempo para revisar as lições aprendidas e identificar o que deu e o que não deu certo. A fase de encerramento é crucial para capacitar a equipe a revisar e melhorar metodologias futuras.

2.2.2 Motivações para projetos

De acordo com Almeida, 2016, p. 40, nenhuma empresa pode se considerar atualizada, a não ser por alguns momentos. Assim, todas deverão lutar contra parte de seu passado para inovar e se transformar. Há uma necessidade premente de criar produtos de sucesso, capazes de encantar clientes e gerar grande demanda e lucros. Diante disso, as empresas buscam caminhos e estratégias capazes de promover as mudanças organizacionais necessárias.

Nesse contexto, cabe ampliar a visão para além das organizações, de modo a considerar elementos externos que agem como motivadores de projetos, variação econômica, metas de qualidade, inovação, bem como a própria gestão do conhecimento.

> Se uma empresa trabalha com linha de produção em série, sem nenhum tipo de customização ao cliente, não tem motivo para usar o gerenciamento de projetos. Já uma empresa que oferece a seus clientes produtos únicos pode iniciar procedimentos para “projetizar” a gestão; porém esse não é o único requisito. Antes disso, é necessária uma mudança radical na cultura organizacional (CANDIDO, 2012, p. 13).

Ainda sobre fatores motivacionais para a existência de projetos nas organizações:

> Cada cliente tem objetivos estratégicos e os projetos que fazemos para eles avançam nesses objetivos. O gerenciamento de projetos é importante porque garante que haja rigor na arquitetura dos projetos de forma que eles se encaixem bem no contexto mais amplo dos quadros estratégicos de nossos clientes. O bom gerenciamento de projetos garante que os objetivos dos projetos estejam alinhados com os objetivos estratégicos do negócio (SANTOS, 2018b).

Heldman (2009) afirma que os projetos podem ser requisitados pelos seguintes itens:

- Demanda do mercado.

► Oportunidade estratégica ou necessidade de negócio.

► solicitação do cliente.

► Avanço tecnológico.

► Exigência legal.

► Impactos ecológicos.

► Necessidade social.

3. GERENCIAMENTO DE PROJETOS

3.1 Conceito de gerenciamento de projetos

Com base no Guia PMBOK® (2017), gerenciar projetos empreende trabalhar conhecimentos, habilidades, ferramentas e técnicas com o propósito de alcançar os objetivos através de requisitos definidos para tal. Tal gerenciamento deve ser fiduciário ao uso e à integração de processos adequados para cada projeto. Este é um importante valor a ser considerado para obter eficiência e eficácia por meio do gerenciamento de projetos.

> Em relação ao gerenciamento de projetos, o manual do Prince2® o define como: planejamento, delegação, monitoramento e controle de todos os aspectos do projeto e a motivação dos envolvidos para atingir os objetivos do projeto, conforme as metas para desempenho no que diz respeito a prazo, custo, qualidade, escopo, benefícios e riscos (ANGELO; LUKOSEVICIUS, 2016, p. 3).

O Guia PMBOK® (2017) menciona três competências a serem desenvolvidas/trabalhadas sobre as práticas do gerenciamento de projetos:

► Associar/relacionar os resultados obtidos com o projeto aos objetivos do negócio.

► Propiciar que as organizações tenham eficácia nos seus segmentos de negócio.

► Ser um elemento de suporte e sustentabilidade para a organização em resposta à dinâmica do mercado, aos planos de gerenciamento de projetos.

3.2 Gerente de projetos

Para que o gerenciamento de projetos seja eficaz, é necessário que haja uma ação efetiva de um gerente de projetos, que zele pelos níveis de qualidade desejados pelo cliente, bem como por cronograma, orçamentos, recursos e cumprimento de especificações.

> [...] gerente do projeto não é o nome de um título, forma de um cargo administrativo, mas a designação do responsável pelo gerenciamento do projeto. É o responsável pelo sucesso ou fracasso do projeto, mesmo quando lhe forem impostas condições absolutamente desfavoráveis (BORGES; ROLLIM, 2016, p. 12).

A liderança envolve o estabelecimento de direção, o alinhamento entre as pessoas e a capacidade de inspirá-las e motivá-las, superando as resistências à mudança. Heldman (2009) considera que liderança e gerenciamento são praticamente sinônimos.

A comunicação é uma das principais habilidades. Um bom gerente tem de ser um bom comunicador e extremamente hábil em trocar informações, seja na comunicação oral, escrita, interna, externa, formal, informal, mídias sociais ou vertical.

O objetivo primordial do gerente de projetos é zelar para que haja sucesso no projeto e para que os produtos ou serviços sejam desenvolvidos dentro do cronograma, do orçamento, da qualidade desejada e com riscos controlados.

Segundo Borges e Rollim (2016), insta compreender que obter resultados de sucesso por meio do gerenciamento de projetos exige competências e habilidades intrínsecas a um gerente de projeto, sendo necessário que este recurso desenvolva tais características a fim de aprimorar seu arcabouço de conhecimento implementando técnicas adequadas a cada situação encontrada.

Um gerente de projetos precisa conhecer e considerar todos os envolvidos nele. A esses indivíduos e/ou organizações que são afetados positivamente ou negativamente pelo resultado do projeto, chama-se stakeholders ou partes interessadas.

3.2.1 Gerenciamento de portfólio e gerenciamento de programas

O gerenciamento profissional do portfólio de projetos envolve analisar o planejamento estratégico das empresas e utilizar de forma profissional as disciplinas de gerenciamento de projetos, programas e portfólio para alcançar os benefícios de negócio estabelecidos neste planejamento (ALMEIDA; ALMEIDA, 2013, p. 13).

O gerenciamento de portfólio pode ser caracterizado pela ordenação ou agrupamento de projetos com propósito específico. Por exemplo, portfólio de projetos do financeiro ou portfólio de projetos de tecnologia da informação.

> Através do gerenciamento do programa busca-se a melhor forma de administrar os projetos contidos no mesmo, maximizando os benefícios esperados e reduzindo, ao máximo possível, fatores que levem ao fracasso do programa (MUTO et al., 2008, p. 6).

De modo a corroborar com a compreensão de Muto et al. (2008), segundo Fernandes e Abreu (2012), o gerenciamento de um programa é a gestão coordenada e centralizada de um programa visando atingir seus benefícios e metas estratégicas.

O gerenciamento do portfólio e o gerenciamento das operações trabalham para que as metas organizacionais sejam alcançadas a partir dos recursos organizacionais utilizados nas atividades recorrentes (operações) e nas atividades projetizadas (projetos).

A figura a seguir demonstra o contexto organizacional.

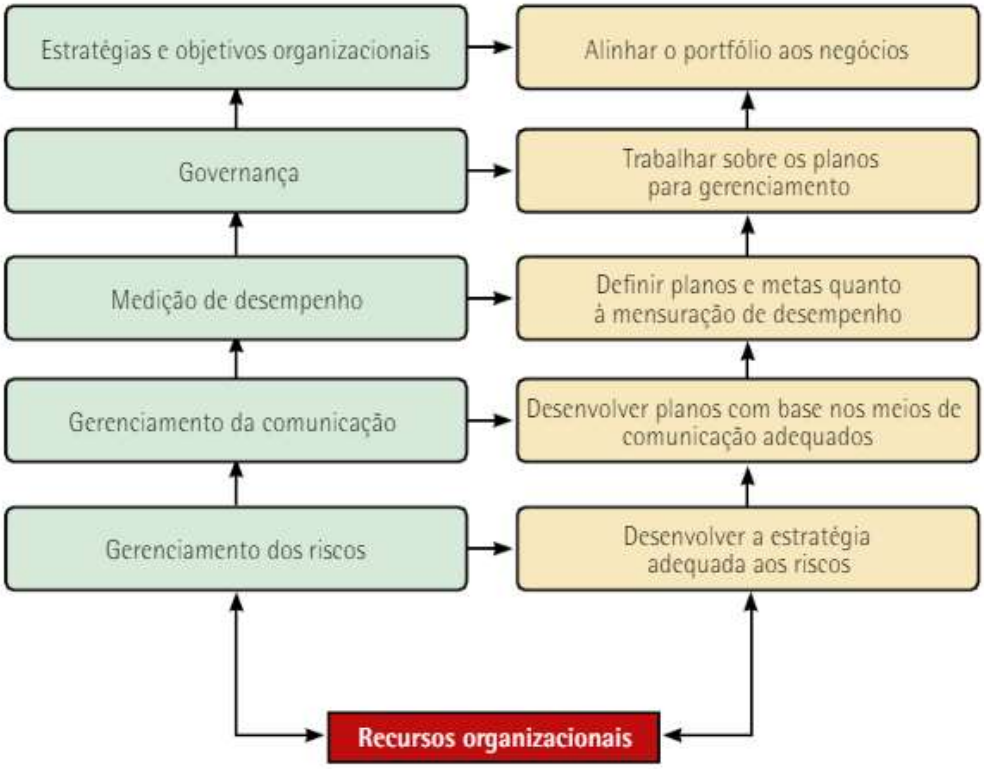

Figura: 1
Contexto organizacional do gerenciamento do portfólio

3.2.2 Gerenciamento ágil de projetos

Ser ágil é utilizar um conjunto recomendado de processos e ferramentas de gerenciamento de projetos, para aqueles projetos onde reinam riscos, incertezas e altas possibilidades de mudanças, e também focados muito mais no fator humano, na interatividade entre as pessoas do que em processos e ferramentas (MASSARI, 2018, p. 1).

O Project Management Institute (PMI) é uma instituição de referência quanto a práticas de gerenciamento de projetos. Tais práticas, em constante atualização, são encontradas no Guia PMBOK® mantido e publicado pelo próprio PMI.

Edições do Guia PMBOK® anteriores à quinta edição apresentaram técnicas e metodologias consideradas tradicionais à época para o gerenciamento de projetos, porém, a partir da quinta edição foi possível destacar o paralelo entre o dinamismo do ciclo de vida de um projeto com o desenvolvimento e adaptação colaborativa e progressiva.

A partir desse contexto forma introduzidas e, deste então, evoluídas as abordagens para o gerenciamento ágil de projetos. A figura a seguir demonstra os quatro valores do manifesto ágil.

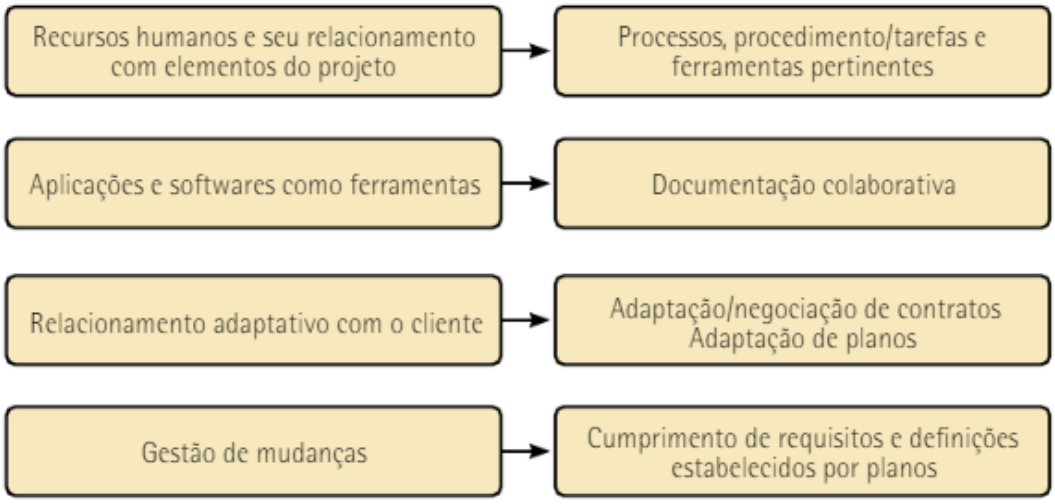

Figura: 2
Os quatro valores do manifesto ágil

3.2.3 Maturidade na gestão de projetos

> O conceito de maturidade pode ser visto como um processo de aquisição de competências que ocorre gradualmente ao longo do tempo. No contexto das organizações, a maturidade precisa ser conquistada através do planejamento e ações tomadas para o aperfeiçoamento dos processos da empresa, de forma a conduzi-la para a realização de seus objetivos (MARQUES; RABECHINI; TOLEDO, 2005, p. 90).

Nesse contexto, é possível compreender que a maturidade na gestão de projetos contempla parâmetros/métricas para determinar o grau de organização em que uma empresa se encontra em comparação a determinado modelo de maturidade.

A possibilidade de mensurar e acompanhar a evolução de processos da organização por uma escala de maturidade propicia aos gestores identificar trilhas e/ou caminhos facilitadores para a gestão.

Berssaneti, Carvalho e Muscat (2012) apontam que muitos modelos de maturidade em gerenciamento de projetos foram surgindo ao longo de pelo me-

nos duas décadas. Os mais conhecidos são: Project Management Maturity Model (PMMM), Organization Project Management Maturity Model (OPM3) e Project Management – Competence (PM-Competence).

O PMMM é composto por cinco níveis, de modo semelhante ao modelo proposto pelo Software Engineering Institute – o Capability Maturity Model (CMM) –, em que cada nível se relaciona a um grau diferente de maturidade em gerenciamento de projetos. Os níveis do PMMM podem ser vistos na figura a seguir.

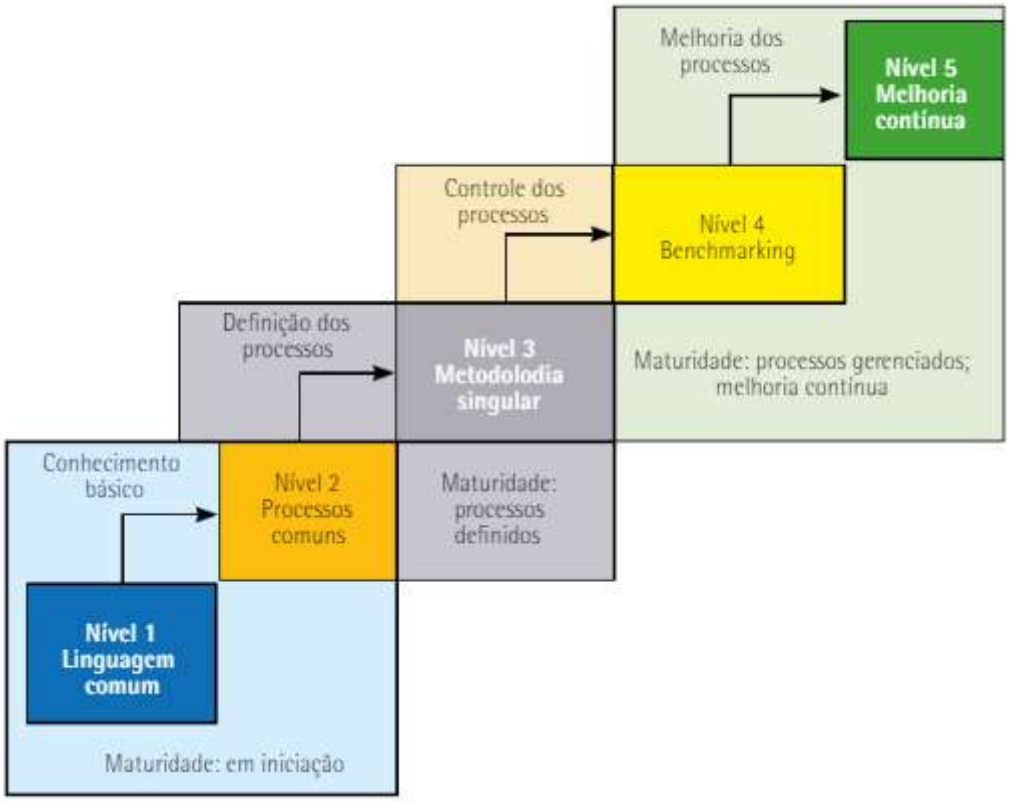

Figura: 3
Níveis de maturidade do PMMM

Segundo Finocchio Junior (2013), o OPM3 foi criado pelo PMI, sendo utilizado conjuntamente ao PMBOK®. Esse modelo estabelece um checklist para verificar o estágio de competência das organizações, bem como identificar e destacar o uso, boas práticas, habilidades e competências que a organização possui e/ou deve possuir para se adequar ao nível de gerenciamento pretendido.

A figura a seguir apresenta a estrutura de estágios a serem trabalhados/explorados em cada domínio: portfólio, programa e projeto.

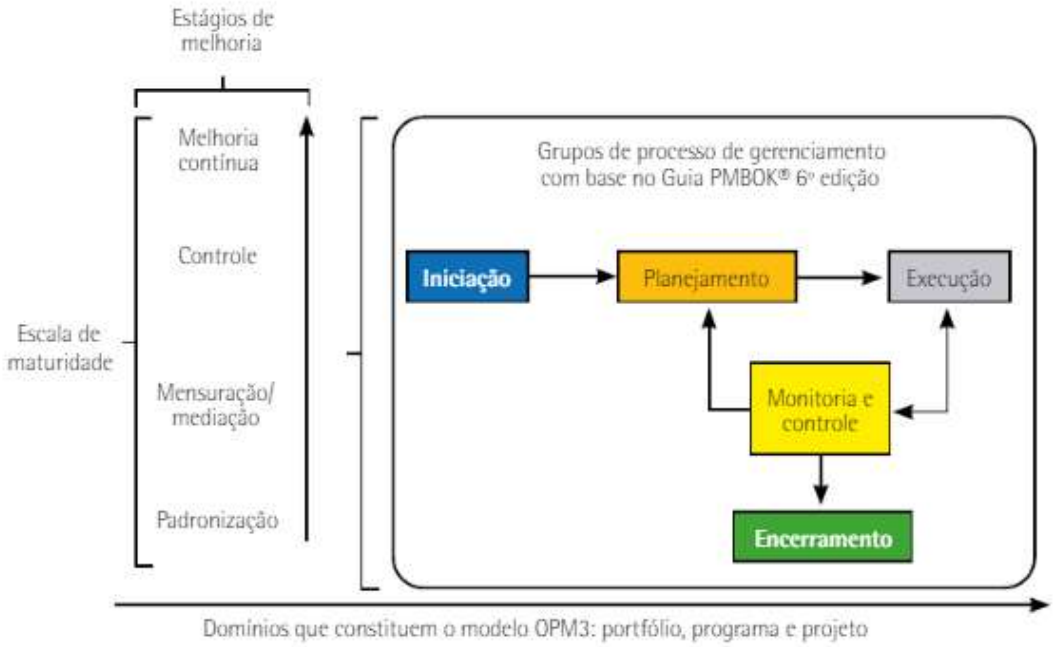

Figura: 4
Modelo OPM3: portfólio, programa e projeto

Proposto por Gareis e Huemann (2000), o modelo PM-Competence determina uma maturidade em cinco estágios pelos quais uma corporação deve passar para tornar-se madura e gerenciada por projetos. Esse modelo permite identificar o grau de maturidade de uma organização através de um questionário de tecnologia da informação, no qual constam perguntas relacionadas a cada nível da escala. O conteúdo das perguntas aborda, por exemplo, conhecimentos sobre organização e cultura, planejamento de objetivo, identificação e resposta a riscos e comunicação. O resultado esperado sobre as perguntas baseia-se nas respostas:

- ► sempre;
- ► raramente;
- ► nunca.

Os estágios e/ou escala desse modelo são compostos por:

Nível 1 – compra da ideia;

Nível 2 – planejamento;

Nível 3 – implementação;

Nível 4 – testes;

Nível 5 – operação da gerência de projetos.

3.3 Influência organizacional

Segundo Freitas (2014), comumente os projetos se integram ou são inseridos a um ambiente organizacional muito maior daquele em que foi executado e gerenciado. Dessa maneira, é de crucial importância conhecer detalhadamente todos os elementos envolvidos intrinsicamente ou tangencialmente ao projeto a fim de garantir que o projeto esteja alinhado às boas práticas já mantidas pela organização. As práticas ou técnicas de gestão e administração empresariais mantidas pela organização têm total influência sobre a forma como o projeto deverá ser estruturado e até mesmo o nível de maturidade cabível e pretendido com base no estilo da organização. Há que se considerar também o envolvimento de entidades externas à organização, visto que entregas do projeto podem afetar ou até mesmo depender direta ou indiretamente de contratos mantidos com esses parceiros.

3.3.1 Influência organizacional: stakeholders

Com base no Guia PMBOK® (2017), partes interessadas, do inglês, stakeholders, é um termo conhecido e utilizado sobre a gestão de projetos e se refere a uma pessoa, colaborador ou não, interno ou não, que tem envolvimento direto num processo ou tomada de decisão para a organização. Sendo assim, é totalmente pertinente e necessária a definição de uma estratégia a ser utilizada para a governança de toda a estrutura da organização em cada fase do projeto. Tal estratégia deve garantir que todos os membros necessários ao projeto estejam engajados no cumprimento das diretrizes definidas, e é responsabilidade do gerente de projeto monitorar a influência desses membros sobre os demais recursos do projeto, inclusive de influenciar recursos a fim de obter ou movimentar recursos e ideias para demandas emergentes em atividades definidas ou em ocorrências adversas ao planejamento do projeto.

A monitoria e o controle de stakeholders é uma tarefa árdua e contínua e não deve ser restrita a um grupo específico de processos de gerenciamento de projetos. Esse processo deve ocorrer de forma transparente e tangente a todo e qualquer projeto, independentemente da atribuição de responsabilidades sobre atividades, visto que influenciadores se movimentam constantemente em detrimento de necessidades internas ou externas às da organização. Desse modo, é totalmente pertinente ter pessoal engajado na identificação e interceptação de novos influenciadores ou desgarrados ao propósito, tempo e orçamento esperado.

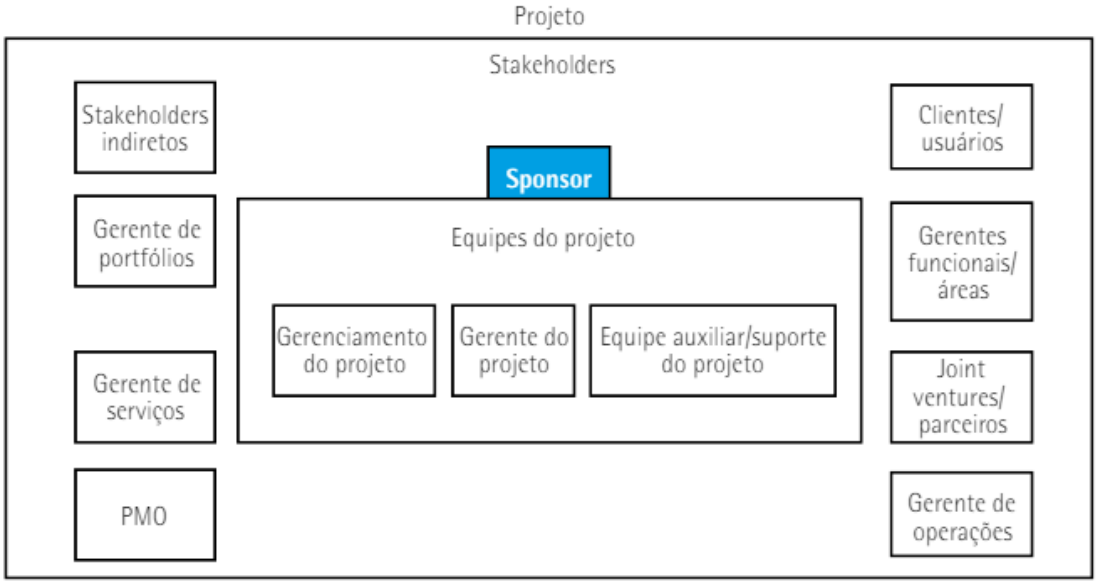

Figura: 5
Influência organizacional: stakeholders

3.3.2 Influência organizacional: cultura organizacional

O Guia PMBOK®, em sua sexta edição (2017), afirma que uma organização pode ter sido moldada pela própria ação do mercado em que se encontra inserida ou pela maturidade e proficiência da organização quanto a processos alinhados a boas práticas de governança corporativa e gerenciamento de serviços reconhecidos quanto a sua eficiência em atingir objetivos específicos. Nesse cenário, o gerenciamento de projeto deve garantir que os objetivos propostos sejam atingidos, porém sem colidir com boas práticas em curso já implementadas na organização. Não é uma tarefa fácil! A cultura de uma organização é

mórfica e constantemente recebe rearranjos empíricos de pessoas envolvidas com:

- ► práticas, expectativas e ideias colaborativas;
- ► marcos de regulação, normas e guias de boas práticas;
- ► adoção de métodos de recompensa e motivação;
- ► apetite por riscos;
- ► entendimento da interação entre elementos hierárquicos e autoridade;
- ► interpretação da missão, visão e valores sobre conduta, ética e trabalho;
- ► ambiente corporativo.

O ambiente operacional de uma organização é criado e mantido conforme a coexistência, experiência e maturidade de seus indivíduos. Sendo assim, é possível e cabível, se necessário, construir e propiciar um novo entendimento ou conhecimento necessário a fim de obter positiva e adequada influência sobre a cultura da organização para maximizar as chances de eficiência e eficácia sobre o projeto.

O entendimento sobre a cultura organizacional deve ser ainda maior levando em consideração tanto aspectos do efeito da globalização quanto compreensão e conflitos de interesse devido à cultura cívica ou estilos administrativos e comerciais mantidos por entidades ao redor do mundo.

3.3.3 Influência organizacional: comunicações

Ainda com base no Guia PMBOK® (2017), as comunicações, a distribuição e o acesso à informação por todas as partes envolvidas no projeto têm crucial importância para garantir a compreensão e o engajamento de partes interessadas, bem como na motivação de patrocinadores, do inglês, sponsor, termo utilizado pelo Guia PMBOK® designado a uma pessoa ou grupo de pessoas responsáveis por garantir recursos e suporte necessários para o sucesso do projeto. São muitos os meios e ferramentas disponíveis para a comunicação organizacional, tais como e-mails, videoconferência, portais eletrônicos, mensagens eletrônicas instantâneas, entre tantas outras. Ainda assim, é cabível ressaltar

que o meio de comunicação utilizado e definidos para uso deve permitir o controle e registro do acesso e até mesmo da inserção e manutenção da comunicação somente por partes devidamente identificados. Dessa forma, outros meios de comunicação não comuns ou informais àqueles definidos para o projeto podem ser potenciais elementos de conflitos diante da diversidade cultural e de estilo encontrada numa organização.

3.4 Estruturas organizacionais

Segundo Freitas (2014), uma estrutura organizacional reúne um conjunto de cargos funcionais e hierárquicos de modo que seus elementos possam interagir a fim de atingir um objetivo específico em comum. O tipo de estrutura pode variar quanto a ser funcional ou projetizada e impacta diretamente na forma como os recursos serão disponibilizados para a condução de um projeto. Cada tipo de estrutura possui características próprias para a composição da hierarquia e gestão de recursos.

Cada organização tem a sua própria maneira de conduzir projetos, possuindo estruturas das mais variadas possíveis, de acordo com a regra de cultura organizacional. Não obstante, as estruturas organizacionais que gerenciam os projetos, normalmente, são enquadradas em uma das três modalidades a seguir:

- ► funcional;
- ► projetizada;
- ► matricial.

3.4.1 Estrutura organizacional: funcional

Esse é o tipo de estrutura mais comum e mais antigo nas corporações, conhecido também como método tradicional de organização: centrado em especializações agrupadas por função.

Tem uma configuração hierárquica e relação de subordinação, em que um funcionário responde a outro imediatamente superior a ele, que responde a outro, até encontrar a última/primeira instância.

Cada departamento é administrado independentemente do outro e com um controle limitado. Os recursos humanos alocados em cada um dos departamentos possuem elementos comuns e experiências semelhantes.

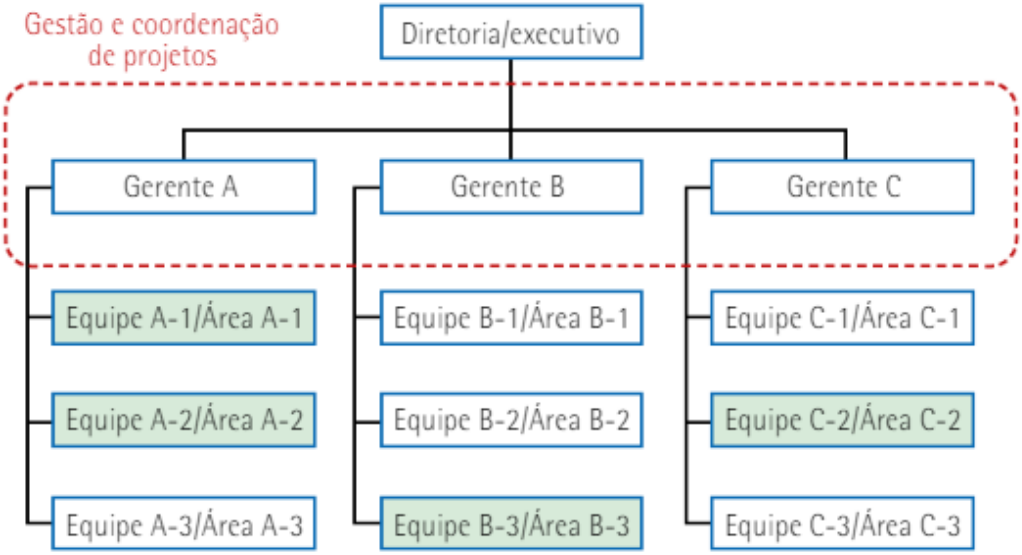

Figura: 6
Estrutura organizacional: funcional

Principais vantagens desse tipo de organização:

► Quando existem projetos, eles são planejados e implementados dentro da própria área.

► Membros da equipe reportam-se ao gerente funcional.

► Organização funcional duradoura, com centralização de recursos similares.

► A definição de carreiras por especializações é muito clara.

Principais desvantagens desse tipo de organização:

► O gerente de projetos tem pouca ou nenhuma autoridade, principalmente em projetos multifuncionais.

► Os funcionários dão maior ênfase ao trabalho técnico de sua área do que aos projetos da organização.

► Não existem carreiras de gerente de projetos.

3.4.2 Estrutura organizacional: projetizada

Essa é a estrutura mais viável para os projetos. Diferentemente do que ocorre na estrutura funcional, o gerente de projetos tem uma grande autoridade, quase absoluta, sendo, na maioria das situações, subordinado diretamente à direção. “Existe uma tendência de que as empresas, cada vez mais, migrem para a estrutura projetizada, ou seja, atuando com base na execução de projetos” (FREITAS, 2014, p. 17).

O foco da organização é o próprio projeto, em vez de especialidades de cada área funcional. Os recursos organizacionais são dedicados aos projetos e a seus objetivos, respondendo diretamente aos gerentes de projetos.

Nessa estrutura, as outras funções (recursos humanos, financeiro, contabilidade, entre outras) são enxergadas como apoio e, algumas vezes, respondem direto aos gerentes de projeto.

Com base no Guia PMBOK® (2017) a estrutura do tipo organização projetizada apresenta grande vantagem quanto a integração, gestão de equipes, distribuição e interação de atividades por equipes e/ou áreas gerenciadas por um gerente de projeto dedicado. O poder para tomada de decisão é facilitado quando há o papel de um gerente de projeto dedicado à frente de um conjunto de equipes e/ou áreas, visto que ele monitora e controla todas as atividades pertinentes ao seu bloco. Ainda assim, é possível distribuir, realocar ou compartilhar atividades entre equipes ou áreas de outros blocos, pois o nível superior de gerência coexiste com o gerenciamento de projetos e a própria gerência do bloco.

Patah e Carvalho (2009) mencionam que a popularização da estrutura projetizada ocorre por quatro razões:

► Velocidade de resposta e orientação ao mercado.

► Desenvolvimento crescente de novos bens, produtos e serviços.

► Rápida expansão de novidades tecnológicas.

► Determinação da alta direção, que não se sente confortável nas estruturas mais antigas.

As principais vantagens dessa estrutura são:

► Gerente de projetos dotado de poder decisório e com recursos sob sua gerência.

► Maior eficiência nos projetos

► Lealdade de recursos de projeto ao gerente de projetos.

► Comunicação mais eficaz entre os componentes da equipe de projetos.

As principais desvantagens desse tipo de estrutura são:

► Ociosidade indesejada, porque os recursos podem não ter outro trabalho quando o projeto acaba.

► Problemas como a alocação e a manutenção de recursos nas etapas finais do projeto.

► Instalações, estruturas e funções duplicadas, porque cada projeto vai naturalmente exigindo seus próprios recursos e estruturas.

3.4.3 Estrutura organizacional: matricial

Essa estrutura organizacional é considerada híbrida, porque combina características da funcional e da projetizada, minimizando, assim, as diferenças entre pontos fortes e fracos dessas estruturas.

A constituição hierárquica da corporação é mantida, ao mesmo tempo que se mantêm técnicas de gerenciamento de projetos eficientes. As personagens do gerente de projetos e do gerente funcional coexistem na corporação, com suas responsabilidades.

O gerente funcional responsabiliza-se por questões administrativas, alocação de funcionários para projetos e áreas de apoio em geral. O gerente de projetos responsabiliza-se pelo planejamento e pela execução do projeto. A análise do desempenho dos recursos do projeto é conjuntamente executada pelos dois gerentes. Enfim, deve haver certo equilíbrio de poder entre os gerentes de projeto e funcional.

Existem três categorias nessa estrutura organizacional:

► matricial fraca;

► matricial forte;

► matricial balanceada.

Na matricial fraca, os gerentes funcionais têm um pouco mais de poder que os gerentes de projeto, e estes são “reduzidos” a coordenadores de projeto, responsáveis apenas pela execução de projetos. É possível observar na figura a seguir a equipe ou área destacada com poder parcial nas tomadas de decisões sobre o projeto gerenciado, a qual funciona como um suporte ou facilitador no gerenciamento de projeto. A equipe ou área deve se reportar a seu respectivo gerente direto.

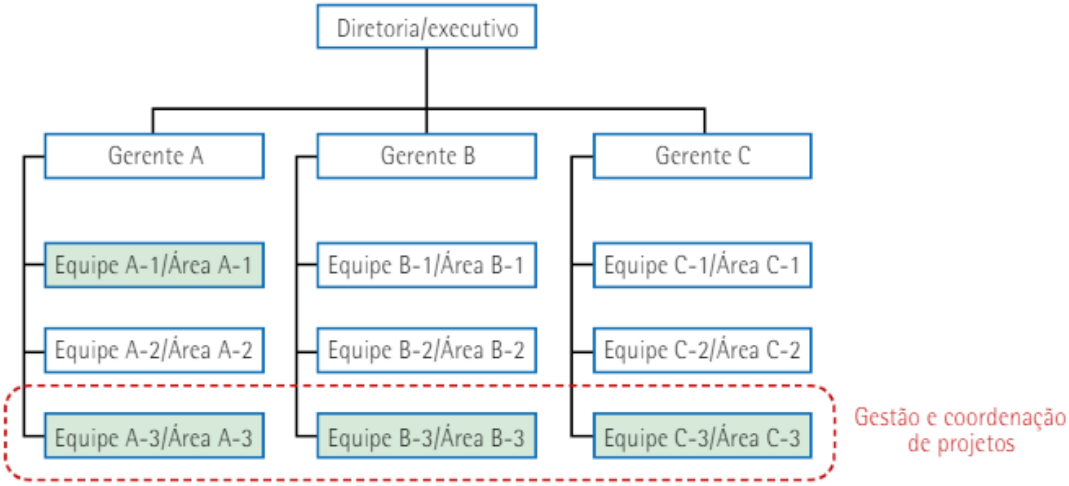

Figura: 7
Estrutura organizacional: matricial fraca

Na matricial forte, os gerentes de projeto têm um pouco mais de poder que os gerentes funcionais conseguindo convencê-los das necessidades corriqueiras de um projeto, como pode ser visto na figura a seguir:

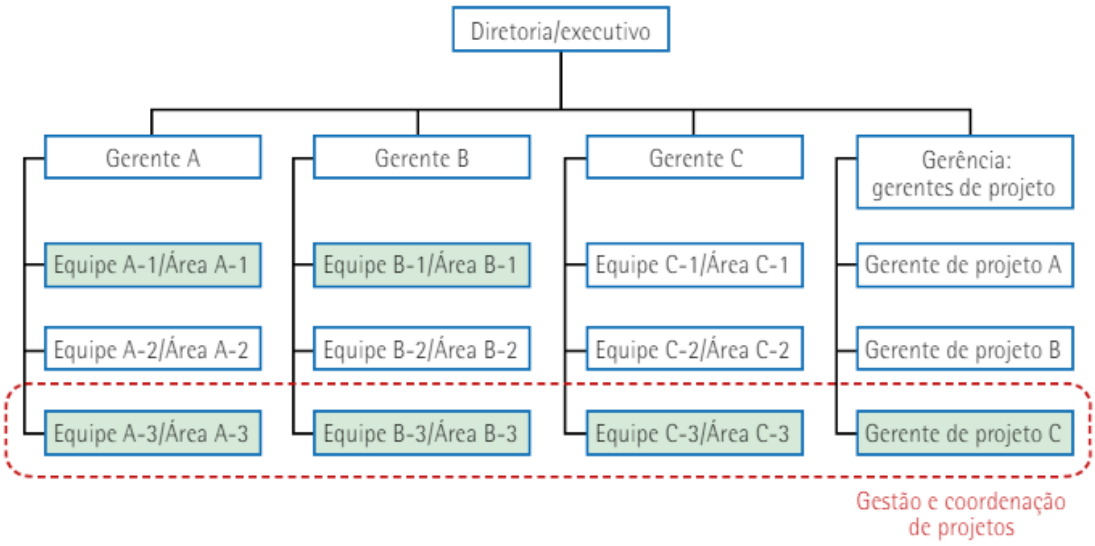

Figura: 8
Estrutura organizacional: matricial forte

Das estruturas matriciais, a balanceada é aquela que se encontrar numa posição intermediária, com os poderes do gerente de projetos e do gerente funcional equilibrados.

A estrutura do tipo organização matricial balanceada se assemelha muito à matricial fraca, porém, nessa estrutura, existe o papel do gerente de projeto dentro da hierarquia de equipes ou áreas; ainda não há uma gerência específica para o gerenciamento de projetos.

A figura a seguir demonstra a estrutura:

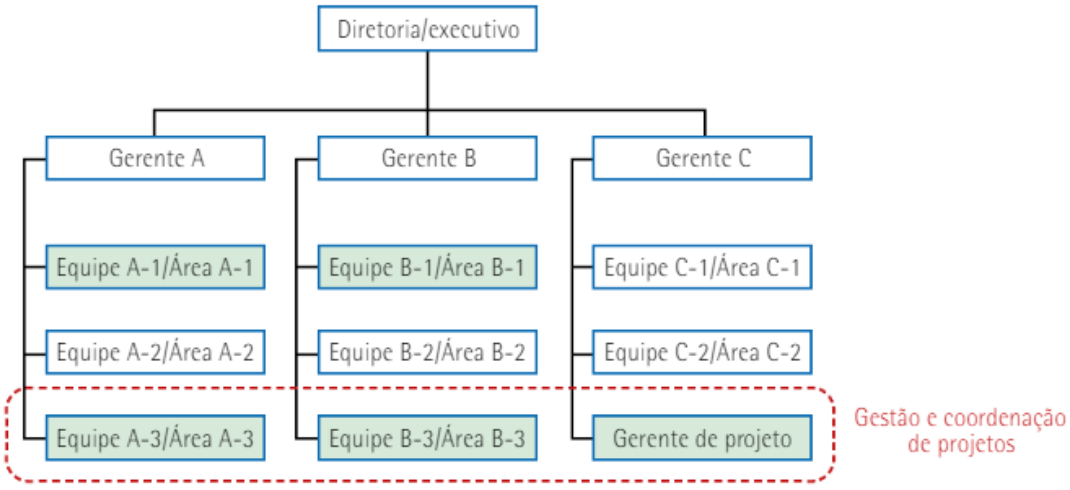

Figura: 9
Estrutura organizacional: matricial balanceada

As principais vantagens das estruturas matriciais são:

► Controle maior por parte do gerente de projetos sobre os projetos.
► Melhor utilização de recursos numa organização.
► Melhora na comunicação entre os membros das equipes.

As principais desvantagens são:

► Existência de dois “chefes” para os recursos.
► Problemas na alocação de recursos, devido a constante conflito entre os gerentes funcional e de projetos.

A estrutura não deve engessar a hierarquia de uma organização. Para tanto, diversas organizações utilizam a composição de tipos organizacionais de estrutura ou estrutura organizacional híbrida, nas quais, por exemplo, são trabalhadas as estruturas organizacionais funcional e projetizada. Nesse cenário, algumas pessoas são destacadas para cumprir funções no gerenciamento de projetos aquém de suas especialidades funcionais ou até mesmo segmentar pessoas de equipes ou áreas distintas para garantir a gestão de projeto por subgrupos de uma área ou equipe. A customização e navegação entre as estruturas organizacionais permite flexibilidade para o gerenciamento de projetos por demanda ou com necessidades específicas atribuídas ou encontradas em determinadas equipes. Dessa maneira, é possível operar sob a estrutura organizacional forte e ativar, conforme necessidade, o destacamento de equipes de pequeno porte para trabalhar em projetos ou atividades especificas adequadas ao cumprimento ou execução de tarefas relacionadas a outras áreas.

4. ESCRITÓRIO DE PROJETOS

O gerenciamento de projetos começou a ganhar destaque no planejamento estratégico das empresas. Para que essa gestão acontecça de forma estrururada e eficiente, é necessário criar uma estrutura formal na organização, denominada “escritório de projeto”(Project Office – PO) ou “escritório de gerência de projetos” (Project Management Office – PMO). Essa estrutura vem sendo adotada por empresas de diferentes portes, com vistas a centralizar as atividades (CANDIDO, 2012, P. 86).

O escritório de projeto é o departamento da organização responsável por gerenciar os projetos sob sua competência. Seu uso é mais comum nas estruturas organizacionais projetizadas. É atividade do escritório de projetos garantir o compliance de processos e procedimentos de gerenciamentos de projetos alinhados às boas práticas de gestão como as mantidas pelo PMI, além de se preocupar com a rentabilidade dos projetos, adequação e otimização de uso de recursos, bem como da satisfação do cliente diante dos resultados obtidos sobre o projeto gerenciado.

Segundo Vargas (2018), algumas atividades requeridas sobre um escritório de projetos:

► Levantar os requisitos necessários.

► Analisar, interpretar e associar caso a caso a metodologia aplicável para o gerenciamento do projeto, bem como estabelecer quais documentos, políticas e procedimentos serão adotados para o gerenciamento.

► Garantir que exista uma base de conhecimento e alternativas que sustentem a gestão de riscos compartilhadas entre projetos tangentes.

► Identificar uma ferramenta de gerenciamento e desenvolver o gerenciamento de projetos de modo que todos os recursos necessários sejam intrínsecos a ela.

► Coordenar e ser o ponto focal de toda a comunicação e divulgação de informações sobre os projetos gerenciados.

► Treinar e garantir a manutenção do conhecimento de gerentes de projeto e colaboradores pertinentes.

► Garantir a monitoria e o controle sobre todas as tarefas em andamento e respectivo feedback aos gerentes de projeto pertinentes a cada projeto.• Gerenciar e conduzir pipeline, follow-up e portfólio de projetos.

► Gerenciar e conduzir os recursos implícitos ao projeto de maneira que sejam atendidos o escopo, custo e o prazo definidos no planejamento de cada projeto.

Ainda segundo Vargas (2018), é possível segmentar nas seguintes funções um escritório de projetos:

Suporte e administração: responsável pela manutenção de cronogramas, relatórios, manutenção de salas de reunião da equipe, manutenção do histórico do projeto e operação de ferramentas/softwares computacionais.

Consultoria e aconselhamento: suporte ao desenvolvimento de propostas, condução de avaliação de riscos, respostas imediatas a necessidades da organização e aconselhamento com a alta administração.

Treinamento: responsável pelo treinamento das equipes de projetos em geral.

Acompanhamento de profissionais: apoio na contratação de profissionais, avaliação das capacidades dos gerentes de projetos e identificação de níveis salariais.

4.1 Implantação de um escritório de projetos

Um escritório de projetos deve compartilhar do entendimento sobre projeto quanto às características desse trabalho em garantir ou empreender a aplicação de recursos de forma temporária, bem como do resultado que não necessariamente será um produto fim, mas, sim, um produto ou serviço que será entrada para um novo projeto.

Sobre todo e qualquer projeto pertinente a um escritório de projeto, caberá seu gerenciamento, sendo requerido, por parte dos profissionais envolvidos, o know-how sobre o conhecimento acerca de boas práticas reconhecidas mundialmente para o gerenciamento de projetos, bem como de habilidades e

conhecimento sobre ferramentas que auxiliam na condução e gestão dos projetos e gerenciamento de produtos de entradas e saídas de projetos.

Segundo Barcaui (2012), algumas razões e fatores devem ser observados para a implantação de um escritório de gerenciamento de projetos numa organização:

► A expertise e maturidade da organização quanto ao uso de documentação e compliance a boas práticas.

► Aperfeiçoamento das práticas de gestão de projetos e redução de projetos que apresentam problemas.

► Melhoria da satisfação dos clientes com relação aos projetos da organização.

► Uso eficiente e eficaz dos recursos de projeto.

► Melhor gestão do conhecimento no ambiente de gestão de projeto, favorecendo a criação do conhecimento explícito.

► Necessidade de transformar o gerenciamento de projetos num gerenciamento estratégico de projetos.

Segundo Pace (2019), metodologias modernas de gerenciamento de projetos não se dedicam a tratar explicitamente de processos lineares. É praxe abordagens alternativas com base em necessidades/requisitos para a gestão dos projetos. Esse fenômeno se destaca em vista de alguns métodos serem mais bem adaptados para a gestão de recursos acerca do desenvolvimento de softwares, já outros, para o gerenciamento de implementação de infraestruturas de tecnologia da informação (TI), bem como práticas de gerenciamento que permitam o controle sobre compliance e/ou migração de normas e marcos reguladores, enfim, modelos diferentes para práticas de gestão de projetos diferentes.

5. REFERÊNCIAS:

ALMEIDA, N., ALMEIDA, F. Metodologia de gerenciamento de portfólio. Rio de Janeiro: Brasport, 2013.

ANGELO, A. S.; LUKOSEVICIUS, A. P. Prince2*: O método de gerenciamento de projetos. Rio de Janeiro: Brasport, 2016.

BARCAUI, A. (org.). PMO: escritório de projetos, programas e portfólio na prática. Rio de Janeiro: Brasport, 2012.

BORGES, C.; ROLLIM, F. Gerenciamento de projetos aplicado: conceitos e guia prático. Rio de Janeiro: Brasport, 2016.

CANDIDO, R. et al. Gerenciamento de projetos. Curitiba: Aymará, 2012.

DINSMORE, P. C.; BARBOSA, A. M. C. Como se tornar um profissional em gerenciamento de projetos: livro-base de “preparação para certificação PMP – Project Management Professional”. Rio de Janeiro: Qualitymark, 2009.

FERNANDES, A. A.; ABREU, V. F. Implantando a governança de TI. Rio de Janeiro: Brasport, 2012.

FINOCCHIO JUNIOR, J. Project model Canvas: planejamento em uma folha. Revista Mundo Project Management, 14 ed., p. 82-82, fev./mar. 2013.

FREITAS, C. A. Certificação CAPM: para membros de equipes e novos gerentes de projetos. 2. ed. Rio de Janeiro: Brasport, 2014.

HELDMAN, K. Gerência de projetos. Rio de Janeiro: Elsevier, 2009.

MUTO, C. A. et al. Gestão de programas e múltiplos projetos. Rio de Janeiro: Brasport, 2008.

PACE, M. A correlational study on project management methodology and project success. Journal of Engineering, Project, and Production Management, v. 9, n. 2, p. 56-65, 2019.

PATAH, L. A.; CARVALHO, M. M. Alinhamento entre estrutura organizacional de projetos e estratégia de manufatura: uma análise comparativa de múltiplos casos. Gestão e Produção, São Carlos, v. 16, n. 2, p. 301-312, abr./jun. 2009.

PMI. Um guia do conhecimento em gerenciamento de projetos (Guia PMBOK®). 6. ed. Atlanta: Project Management Institute, 2017.

VARGAS, R. V. Gerenciamento de projetos: estabelecendo diferenciais competitivos. 9. ed. Rio de Janeiro: Brasport, 2018.
